


【恵利原橋(進捗状況)】



令和6年4月より現場着手し4ヶ月が過ぎました。
これまで、現場の地盤調査を行い、ケーブルクレーン架設のための各種基礎(鉄塔・Co支圧板)を構築していました。
本日、基礎の最終コンクリート打設が無事完了しました。
今後、グラウンドアンカー工に着手し架設準備を進めます。
毎日、うだるような酷暑の中、協力会社と共に元請け管理者も全力投球で日々頑張っています。
今後も、一人一人とコミュニケーションを図り安全意識を高く持って工事を進めます。

現場代理人・監理技術者:狩野 工事主任:ファット・中谷

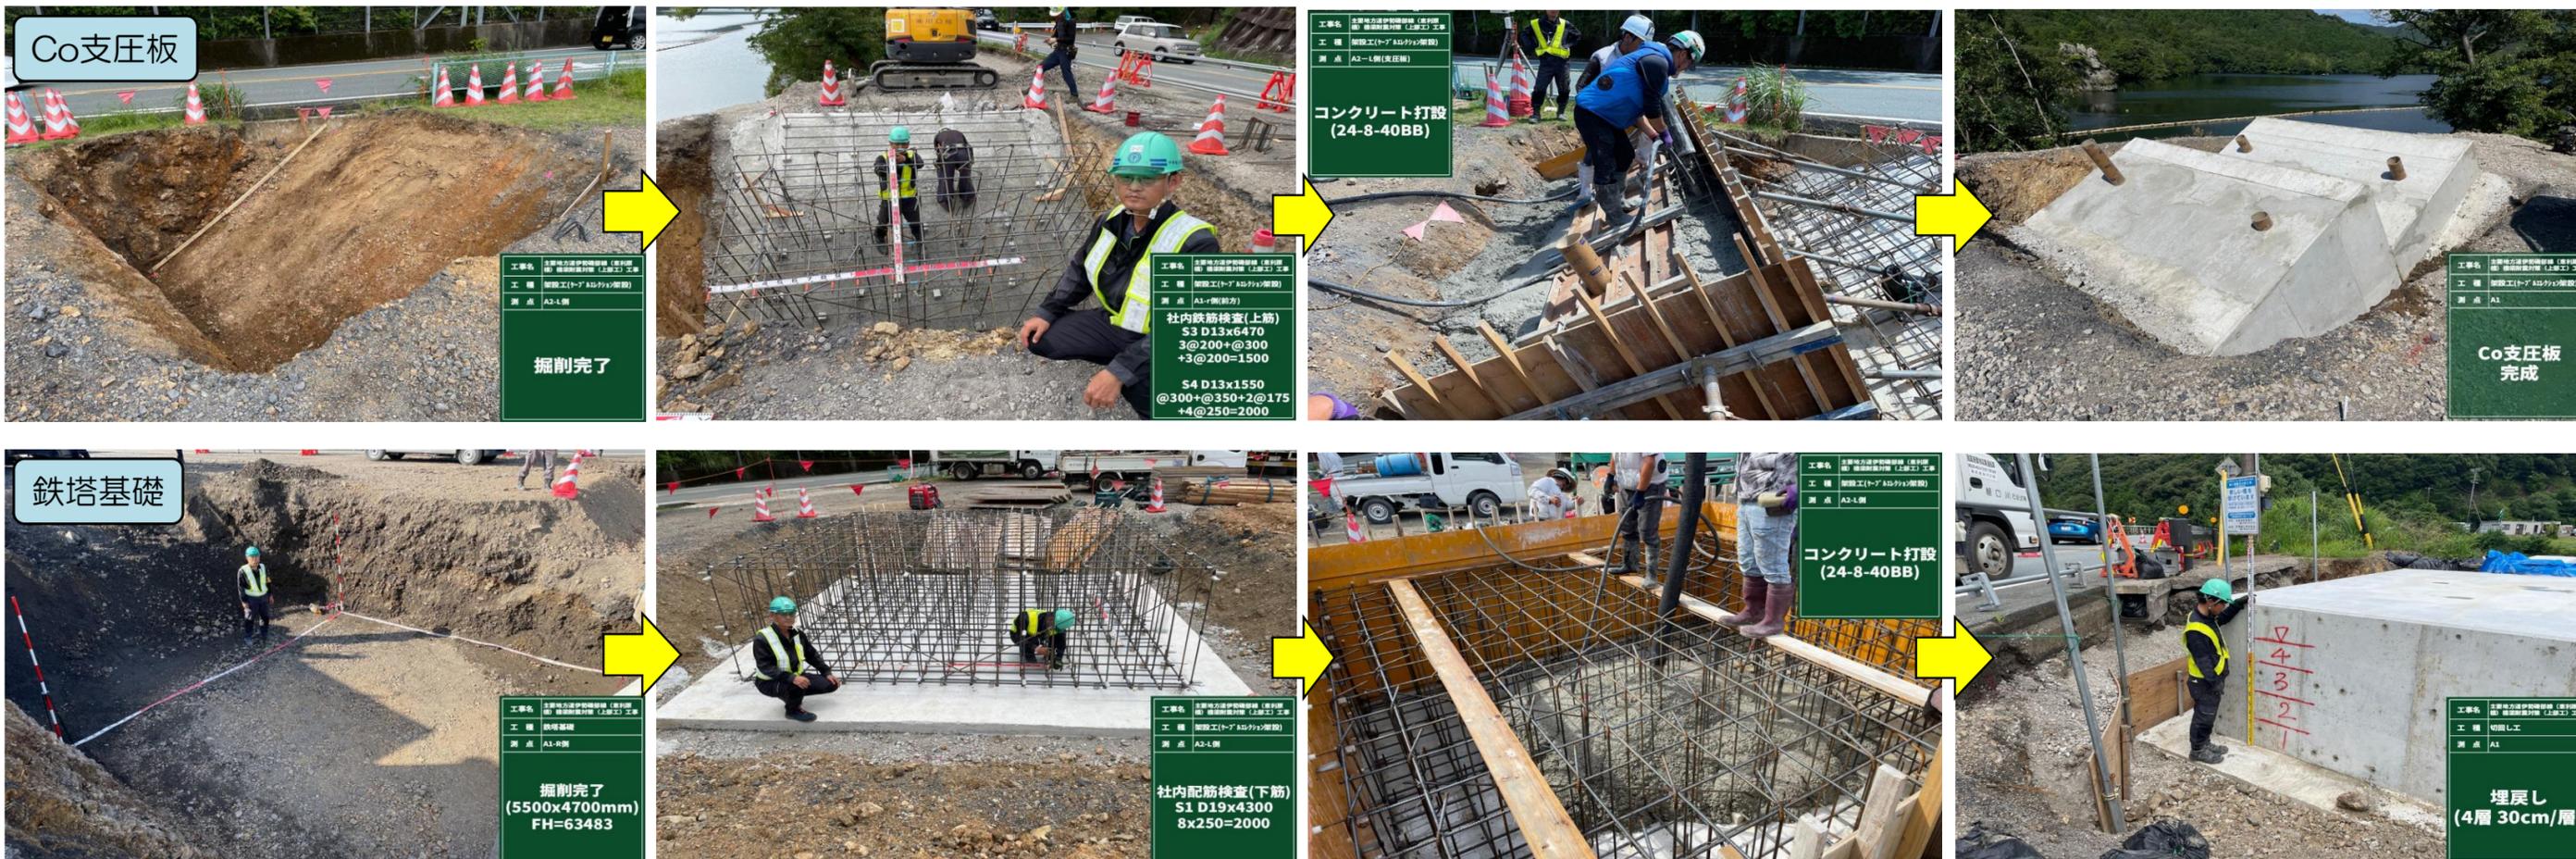
