

# 【恵利原橋(進捗状況 9月)】




工事名	主要地方道伊勢磯部線(恵利原橋)橋梁耐震対策(上部工)工事
工種	グラウンドアンカー
測点	A1-L側(後方-道路側)

グラウンドアンカー挿入


秋の日も過ぎ、漸く気温が落ち着いて、秋の気配が感じられますようになりました。現場は、令和6年4月より着手し概ね6ヶ月が経過しました。

現在、ケーブルクレーン架設のために重要となるグラウンドアンカー作業(削孔・アンカー体挿入・グラウト注入)を行っています。

10月は、いよいよ鉄塔の組立作業を開始します。墜落災害の危険の伴う作業となるため、今まで以上に、一人一人とコミュニケーションを図り安全意識を高く持って工事を進めます。

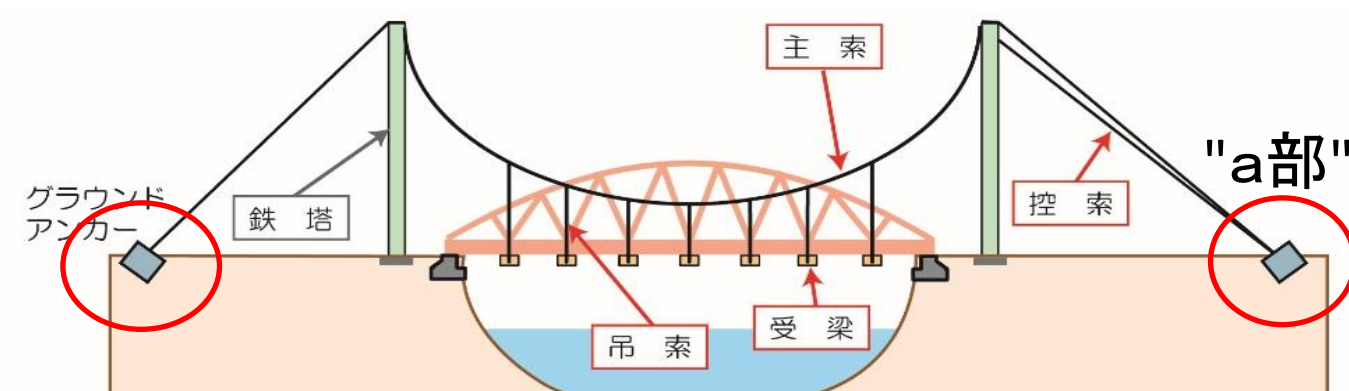

a部詳細

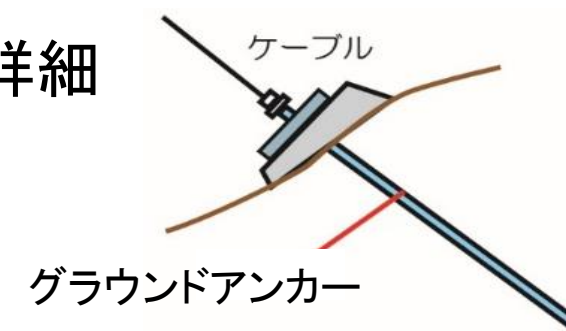

現場代理人・監理技術者:狩野 工事主任:ファット・中谷
