


# 【恵利原橋(進捗状況 11月)】



## プロフェッショナル軍団

鉄塔頂部からの景色

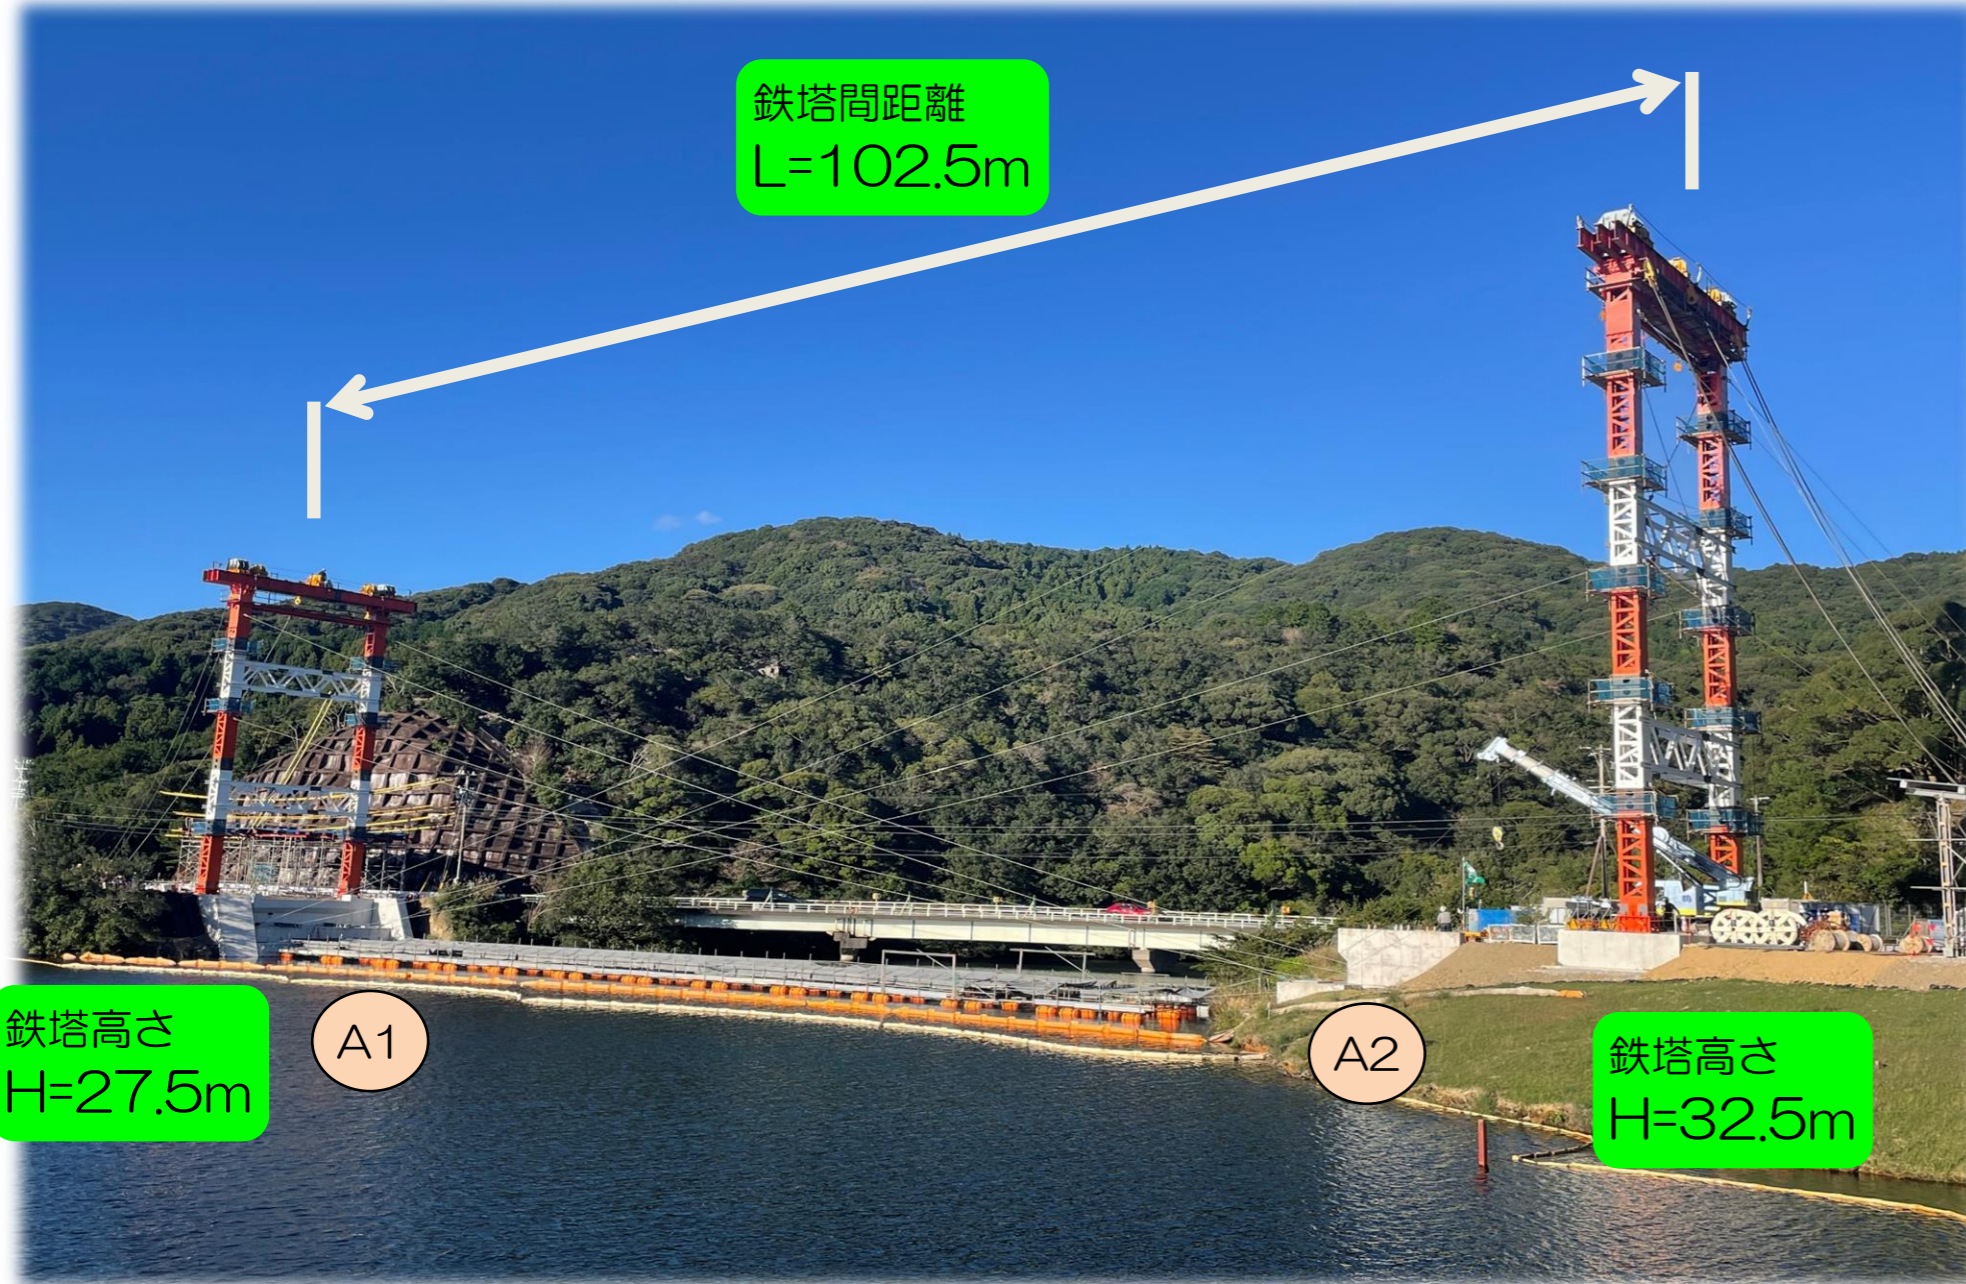

様式第7号(第9条、第99条関係)(表前)

第525号 (クレーン) 検査証	
設置地	志摩市磯部町恵利原地内
事業の名称	宇野重工(株) 主要地方道伊勢磯部線(恵利原橋)橋梁耐震対策(上部工)工事
種類及び型式	固定ケーブルクレーン(両塔固定型式ケーブルクレーン(上流側1号機))
つり上げ荷重	7.355 t
有効期間	検査者印
令和6年11月18日から 令和8年11月17日まで	
年月日から 年月日まで	年月日から 年月日まで
年月日から 年月日まで	年月日から 年月日まで
年月日から 年月日まで	年月日から 年月日まで
年月日から 年月日まで	年月日から 年月日まで
令和6年 11月 18日	
伊勢 労働基準監督署長	

令和6年4月より着手し概ね8ヶ月が経過しました。

鉄塔・ケーブルクレーン設備の組立が完了しました。

11月18日には、労働基準監督署のクレーン落成検査を受検し、無事に検査証を交付して頂きました。

12月上旬までにエレクション設備を組立て、いよいよ桁架設を開始します。墜落災害の危険の伴う作業となるため、今まで以上に、一人一人とコミュニケーションを図り安全意識を高く持って工事を進めます。

現場代理人・監理技術者: 狩野 工事主任: ファット・中谷

